

## ⑥本格的復旧整備事業(5ヵ年)

### 丸亀城石垣崩落復旧事業概要

ア 事業名	丸亀城石垣崩落復旧整備事業
イ 事業内容	帯曲輪石垣及び三の丸石垣復旧工事
<u>ウ 事業期間</u>	<u>契約日から令和6年3月31日まで(約60ヵ月)</u>
<u>エ 事業規模</u>	<u>復旧石垣個数 約6,000個</u>
<u>オ 総事業費</u>	<u>31.5~35.5億円(業務委託費を含む)</u>

## 熊本城視察



参考: 熊本城資料

## 本格復旧工事

### ●発注条件・目標

- ① 安全で最適な技術を駆使して、5年間で石垣を復旧する工事
- ② 現場条件が把握できておらず、前提となる仕様や条件の確定が困難な工事
- ③ 施工者のノウハウを反映し、また高度で専門的な工法等を活用し、現場条件に適した設計で期間短縮を図り、施工することが必要




【設計交渉・施工タイプ】での契約方針

### ●契 約 （「国土交通省直轄工事における設計交渉・施行タイプの運用ガイドライン」を参考）

スケジュール

	1月	2月	3月
採点委員選任 実施要領等作成 要求水準書作成 など事前準備	事前準備 →	公告期間 →	審査期間 → 報告★(3/25)

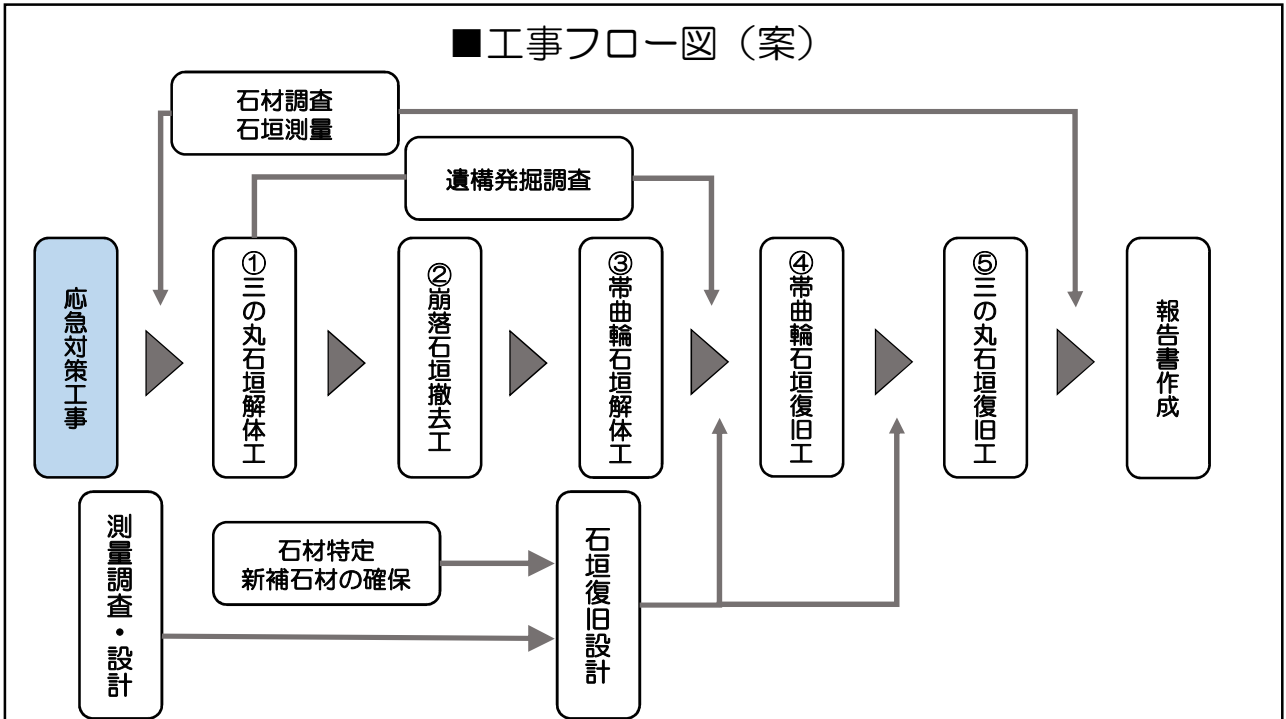



工程表  
(案)

業務名称	数量	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)
▶ 応急対策工事	1式	●				
▶ 施工計画・協議資料・報告書作成	1式	●	●	●	●	●
▶ 安全監視(動態観測等)	1式	●	●	●	●	●
▶ 調査 測量・地質調査	1式	●	●			
文化財調査・遺構発掘調査		●	●	●	●	
▶ 設計 仮設構造物設計	1式	●	●			
崩壊メカニズム解析	1式	●	●			
地盤安定工・基礎工設計	1式	●	●			
施工方法検討及び詳細設計	1式	●	●	●	●	
▶ 仮設工事	1式	●	●			
▶ 三の丸石垣(修理・埋没石材)						
解体工・石材調査	1,340個	●	●			
▶ 三の丸・帯曲輪石垣(崩落石材)						
解体工・石材調査	3,710個	●	●			
▶ 帯曲輪石垣(修理・埋没石材)						
解体工・石材調査	300個	●	●			
▶ 帯曲輪石垣 復旧工	1,160m <sup>2</sup>			●	●	●
▶ 三の丸石垣 復旧工	1,470m <sup>2</sup>				●	●
▶ 後片付け工						●
